



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEL ESTADO-UCEE-



MEMORIA DE LABORES

GUATEMALA, DICIEMBRE, AÑO 2020

INDICE

Introducción	2
I. Información general	3
II. Principales acciones y logros	4
Resumen de logros programados y ejecutados 2020	4
Logros alcanzados en ejecución 2020	5
1. Proyectos de inversión pública ejecutados años, 2020.	5
Educación	5
Edificios publicas	5
2. Remozamientos integrales año, 2020 (ejecución, evento y adjudicación).....	6
3. Proyectos programados 2020, para ejecución multianual 2020-2021	7
Cocinas dignas	7
4. Mobiliario Escolar.....	9
4. Logros alcanzados, proyectos programados 2020.....	10
remozamientos planificados 2020	10
5. Convenios.....	10
6. Ejecución presupuestaria	11
III. Principales desafíos	12
IV. ANEXOS.....	13

Introducción

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, bajo la cobertura del viceministerio de Edificios Estatales y Obras Pública, en conjunto realizan una logística de Programación, Planificación y Ejecución de Proyectos de: Construcción, Ampliación, Mejoramiento, Reposición y Remozamiento de la infraestructura estatal; priorizando la infraestructura escolar, hospitalaria y toda aquella infraestructura que sea de carácter público.

Respondiendo así al Plan Nacional de Desarrollo K’atun “Nuestra Guatemala 2032; en sinergia con la política general de gobierno 2020-2024, que establece las directrices para el seguimiento y administración de futuros Gobiernos por medio de los 5 pilares del Plan, que son los siguientes: Economía, Competitividad y Prosperidad, Desarrollo Social, Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo [1]

En relación a las políticas del gobierno actual, PGG 2020-2024 en sinergia con el Plan Nacional de Desarrollo Guatemala 2032; La -UCEE-, tiene un papel importante en el desarrollo de “*EL EJE BIENESTAR PARA LA GENTE*”, *DESARROLLO SOCIAL, Y SEGURIDAD EN DESARROLLO*, que incluye servicios integrales de calidad en salud y educación; servicios básicos; habitabilidad segura; y acceso; que tiene como finalidad solventar las necesidades de infraestructura estatal.

[1] De conformidad con lo establecido en Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032. Guatemala: Conadur/Segeplán, 2014.
Política General de Gobierno 2020-2024

I. Información general

1. Viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura, Unidad de Construcción de Edificios del Estado, -UCEE-
2. 2 calle “A” 8-49 zona 10, Guatemala
3. Viceministro Javier Maldonado Quiñonez
Director interino: Oscar Guillermo Sierra Pacay
4. 2245-1212 Planta
 - EXT 202, 201, 218 Dirección
5. Correo institucional: osierra@ucee.gob.gt
Correo personal: oscargsierra500@gmail.comz
6. Ingrid Johana García Mazariegos, Secretaria de Dirección/Subdirección

II. Principales acciones y logros

La Unidad de Construcción de Edificios de Estado, -UCEE-, tiene a su cargo para el ejercicio fiscal 2020, la planificación, ejecución, recepción y liquidación de; 329 centros educativos, en el sub producto de Remozamientos de edificios públicos, 41 proyectos de inversión, 15 proyectos educativos, 24 Mejoramientos de centros de salud, -CAP-, y 2 edificios públicos dentro del programa regular 14 “Construcción de obra pública, en la obra de; construcción, ampliación, reposición y mejoramiento; 594 MÓDULOS PREFABRICADOS DE COCINAS TEMPORALES “COCINAS DIGNAS” y dotación de mobiliario escolar.

Resumen de logros programados y ejecutados 2020

Proyectos de remozamientos integrales, renglón 171 “*mantenimiento y reparación de edificios del estado*”.

330	Total, de proyectos de remozamientos
30	Adjudicados, en proceso de firma de contrato
5	Ejecución de fianza / y anulado
57	En ejecución
26	Proyectos en evento en Guatecompras
98	En planificación 2020
37	Recepción y liquidación
77	Proyectos en planificación por emergencia ETA y OITA

Proyectos de construcción, ampliación, reposición y mejoramiento programa 14 “construcción de obra pública”

41	Total, de proyectos de inversión
	Educación
7	En ejecución
8	En proceso de planificación
	Salud
5	Adjudicados
4	En formulación de expediente para aprobación de -SEGEPLAN-
8	En evento en Guatecompras
5	Terminados
2	En proceso de recepción y liquidación
	Edificios públicos
2	En ejecución

Proyectos de “Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas”, Renglón 3294

594	Total, de proyectos
594	Módulos prefabricados de cocinas temporales “cocinas dignas”,
324	Módulos proyectados iniciar diciembre 2020
270	Módulos para iniciar ejecución 2021
94	Total. Mobiliario escolar
94	Establecimientos educativos en licitación, que serán beneficiados con mobiliario escolar

Logros alcanzados en ejecución 2020

Los logros de la presente administración están encaminados al pilar de desarrollo social de la Política General de Gobierno PGG 2020-2024, el cual tiene como objetivo el incremento de la tasa neta de cobertura en el nivel, primario, básico, y diversificado, por lo cual se presentan los siguientes logros alcanzados en los proyectos clasificados en el programa 14 “Construcción de obra pública”:

1. Proyectos de inversión pública ejecutados años, 2020.


La unidad de construcción de Edificios del Estado -UCEE-, inicio durante el año 2020, 5 proyectos de inversión pública, en la clasificación de proyectos de centros educativos los cuales se enlistan a continuación:

Educación

1. Reposición escuela primaria oficial rural mixta, aldea la vega, Zacualpa, quiche.
2. Construcción escuela primaria oficial rural mixta, caserío san Antonio, aldea paviltzaj, Cuilco, Huehuetenango.
3. reposición escuela primaria oficial rural mixta, aldea Jovi, Cuilco, Huehuetenango.
4. construcción escuela primaria oficial rural mixta, aldea Huispache, concepción Tutuapa, santos marcos.
5. Construcción instituto diversificado e instituto básico, cabecera municipal, san Antonio Sacatepéquez, santos marcos.

Inversión de educación en programa 14 “construcción de obra pública” a diciembre 15/12/2020 = **Q.7,194,020.60**

TOTAL, DE BENEFICIARIOS = **326 HOMBRES, 302 MUJERES**

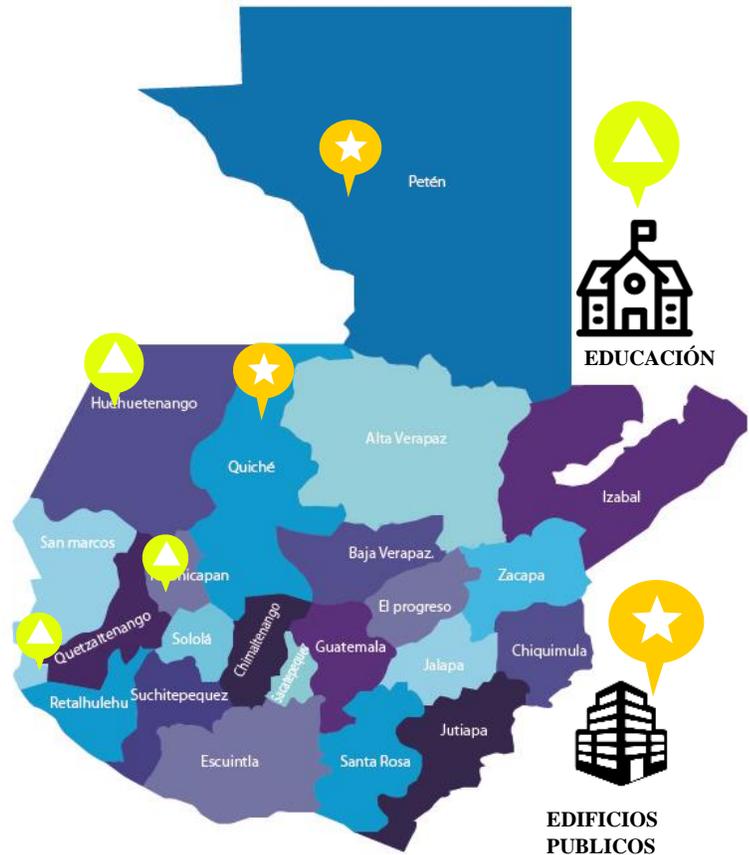

MAPA: PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020

Edificios publicas

Dentro de la programación para el ejercicio fiscal 2020, la -UCEE-, en convenio con la secretaria de planificación de la presidencia -SEGEPLAN-, se inició la ejecución de los siguientes edificios públicos, vinculados a la PGG-2020-20204 “Desarrollo Social”.

1. Construcción edificio de la Delegación subdepartamental de Ixcán, quiché.
2. Construcción edificio de la delegación departamental de peten en el municipio de flores departamento de peten

TOTAL, DE BENEFICIARIOS = **217 HOMBRES, 227 MUJERES**


Inversión de edificios públicos en programa 14 “construcción de obra pública” a diciembre 15/12/2020 = **Q.1,270,620.73**

2. Remozamientos integrales año, 2020 (ejecución, evento y adjudicación)

Durante el ejercicio fiscal 2020, se logró gestionar un total de 118 Proyectos de remozamientos integrales, los cuales se encuentran desglosados al mes de octubre del presente año, de la siguiente manera:

- 30 adjudicado
- **57 en ejecución**
- 5 ejecución de fianza / y anulado
- 26 proyectos con publicación de eventos en proceso de adjudicación

Esos esfuerzos se encuentran vinculados al Plan Nacional de Desarrollo K'atun "Nuestra Guatemala 2032; en sinergia con la política general de gobierno 2020-2024. Teniendo como indicador el incremento de cobertura en el nivel, primario básico, y diversificado de los departamentos mencionados a continuación:

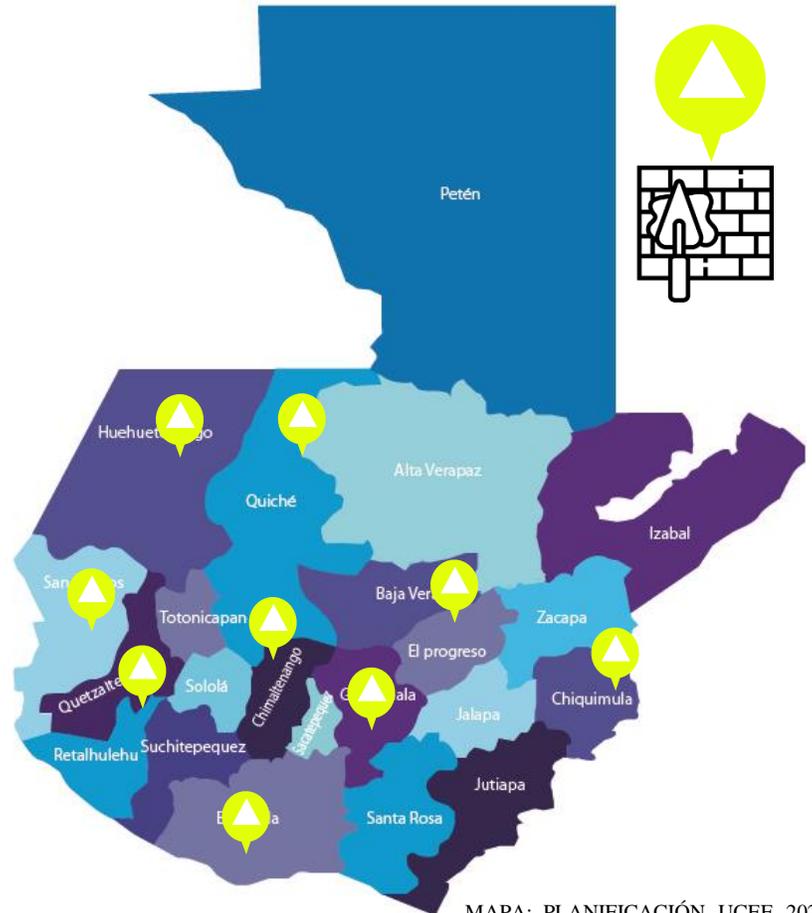

MAPA: PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020

Departamento	Cantidad de escuelas	beneficiarios			
Alta Verapaz	10	329	hombres	340	Mujeres
Guatemala	62	11,005	hombres	9,626	Mujeres
Huehuetenango	11	1,199	hombres	1,127	Mujeres
Quetzaltenango	4	572	hombres	501	Mujeres
Quiché	8	359	hombres	362	Mujeres
Zacapa	13	497	hombres	428	Mujeres
Baja Verapaz	2	60	hombres	38	Mujeres
Chimaltenango	5	507	hombres	458	Mujeres
Escuintla	2	309	hombres	278	Mujeres
San Marcos	1	0	hombres	301	Mujeres
totales	118	14,837	hombres	13,459	Mujeres

Inversión de proyectos "mantenimiento y reparación de edificios públicos" "renglón 171 (remozamientos integrales) a Diciembre 15/12/2020 = **Q.26,112,609.57**

total, de beneficiarios = **14,837 hombres, 13,459 mujeres**

3. Proyectos programados 2020, para ejecución multianual 2020-2021

Cocinas dignas

El proyecto de **Cocina Digna** nace del contexto, de la falta de espacios adecuados para la elaboración de alimentación escolar, debido al mal estado de la infraestructura educativa y ausencia en algunos casos dentro de los establecimientos educativos, lo cual da como resultado una deficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, derivado de la falta de salud nutricional en cada estudiante, por esta razón está enfocada a la seguridad nutricional y alimentaria, de la población estudiantil, y vinculada al eje de la PGG, 2020-2024 *SEGURIDAD EN DESARROLLO*.

Por tal motivo “**COCINAS DIGNAS**”, tiene como objetivo el mejoramiento del servicio educativo mediante la creación de espacios que cumplan con las condiciones higiénicas que demandan las necesidades y condiciones humanas, para la elaboración de refacciones escolares. El proyecto consiste en la *ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 594 MÓDULOS PREFABRICADOS DE COCINAS TEMPORALES “COCINAS DIGNAS”*, desarrollado en un área de 30 m², la cual contara con áreas de preparación de comida, área de lavado, plancha de acero inoxidable para preparación de alimentos y mobiliario.

Para el ejercicio fiscal en curso se tiene contemplado llevar a cabo los eventos y adjudicación de los 32 grupos de cocinas, siendo 594 cocinas distribuidas en los siguientes departamentos de la Republica de Guatemala.

DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE ESCUELAS
<i>Alta Verapaz</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Baja Verapaz</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Chimaltenango</i>	52 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Chiquimula</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Petén</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>El Progreso</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Quiché</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Escuintla</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Guatemala</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Huehuetenango</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Izabal</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Jalapa</i>	33 módulos prefabricados de cocinas temporales


DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE ESCUELAS
<i>Jutiapa</i>	18 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Quetzaltenango</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Retalhuleu</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Sacatepéquez</i>	2 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>San Marcos</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Santa Rosa</i>	30 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Sololá</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Suchitepéquez</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Totonicapán</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales
<i>Zacapa</i>	27 módulos prefabricados de cocinas temporales



DISEÑO: ARQ CARLOS QUIÑONEZ -UCEE-2020



DISEÑO: ARQ CARLOS QUIÑONEZ -UCEE-2020

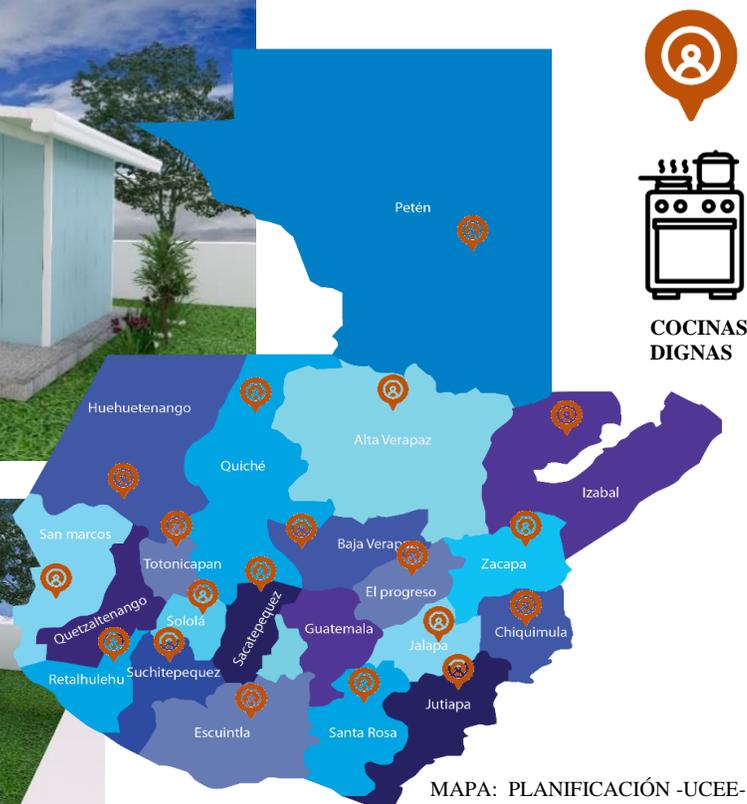

MAPA: PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020

Total, de Beneficiarios 69,424


324 Módulos proyectados iniciar diciembre 2020

270 módulos para iniciar ejecución 2021

4. Mobiliario Escolar

La unidad de construcción de edificios del estado, -UCEE-, tiene proyectado en el último cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 la adquisición, transporte y entrega de mobiliario escolar a centros educativos en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Sololá, escuintla, Santa Rosa, Alta Verapaz y Huehuetenango. Contemplada dentro de la programación de obra de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE-, con numero de NOG 13370162 Distribuidos de la siguiente manera:

- 350 juego de mesa hexagonal con sillas para preprimaria
- 5,019 mesas bipersonales con silla para primaria
- 258 mesas bipersonales con silla para básico
- 50 mesas bipersonales con silla para diversificado
- 375 cátedras
- 324 pizarrones

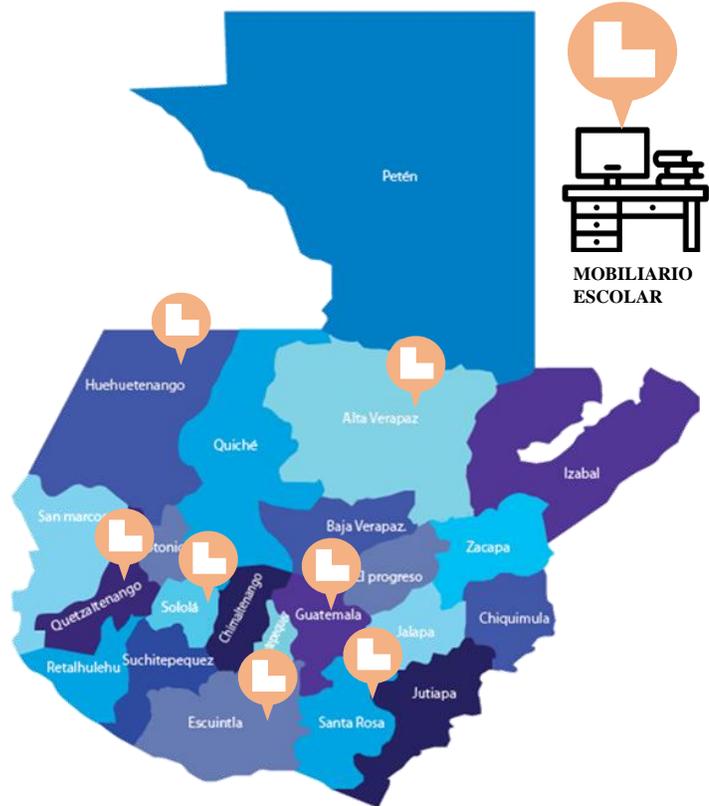

MAPA: PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020

DEPARTAMENTO

CANTIDAD DE ESCUELAS

Guatemala	29 escuelas con dotación de mobiliario y equipo
Chimaltenango	5 módulos prefabricados de cocinas temporales
Sololá	1 módulos prefabricados de cocinas temporales
Escuintla	5 módulos prefabricados de cocinas temporales
Santa Rosa	3 módulos prefabricados de cocinas temporales
Alta Verapaz	18 módulos prefabricados de cocinas temporales
Huehuetenango	33 módulos prefabricados de cocinas temporales

Total, de beneficiarios 94 establecimientos educativos.


5. Logros alcanzados, proyectos programados 2020

remozamientos planificados 2020

En la actualidad la UCEE; Tiene a cargo el desarrollo de la panificación de **98 remozamientos** integrales los cuales se encuentran en la fase de pre factibilidad, así mismo derivado de la tormenta ETA Y OITA, se tiene previsto la intervención de **77 remozamientos** integrales de los cuales a la fecha ya se realizaron 19 levantamientos planimétricos. los cuales serán beneficiados con el estudio de factibilidad, en el ejercicio fiscal 2020.



EDUCACIÓN

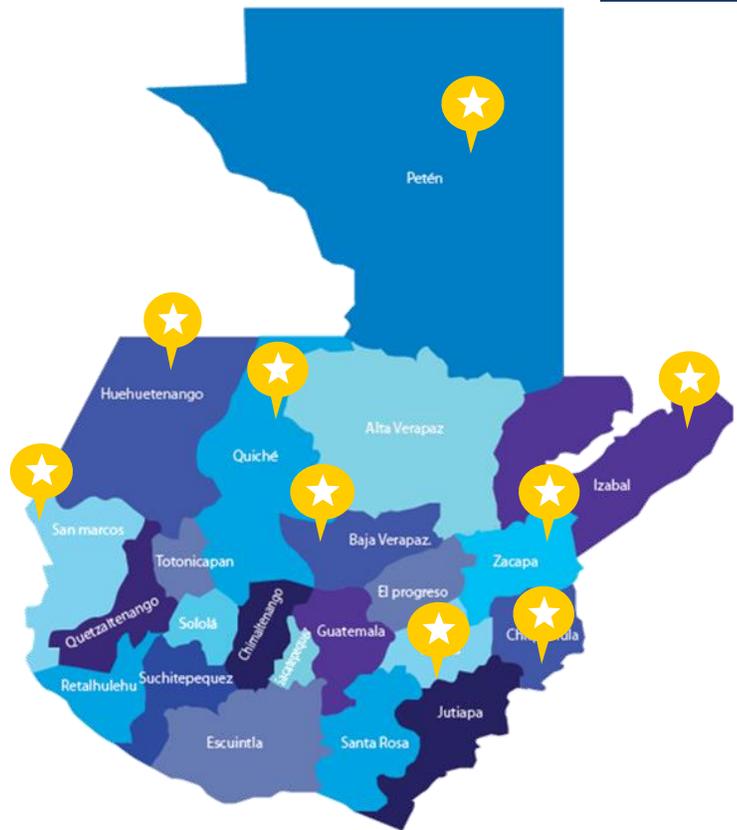

DEPARTAMENTO

CANTIDAD DE ESCUELAS

<i>Suchitepéquez</i>	1 centros educativos planificados 2020
<i>Zacapa</i>	31 centros educativos planificados 2020
<i>San Marcos</i>	11 centros educativos planificados 2020
<i>Quiche</i>	5 centros educativos planificados 2020
<i>Quetzaltenango</i>	11 centros educativos planificados 2020
<i>Jalapa</i>	2 centros educativos planificados 2020
<i>Izabal</i>	3 centros educativos planificados 2020
<i>Huehuetenango</i>	23 centros educativos planificados 2020
<i>Baja Verapaz</i>	7 centros educativos planificados 2020
<i>Chiquimula</i>	4 centros educativos planificados 2020
	98 en proceso de planificación

MAPA: PLANIFICACIÓN -UCEE- 2020


6. Convenios

La -UCEE-; coadyuvado con la -SEGEPLAN-; Afirmaron el convenio para la construcción edificio delegación sub-departamental de SEGEPLAN, Poptún, Petén” por un monto de Q 2,400,000.00. nombre del “**convenio administrativo interinstitucional de cooperación para la ejecución de los trabajos de construcción edificio delegación sub-departamental de segeplan, poptún,**

Así mismo, la unidad con apoyo del departamento financiera concretó el préstamo BCIE No. 2138 como unidad co-ejecutora de dicho préstamo, juntamente con el Ministerio de Educación, en la fuente 52 “prestamos externos” estructura presupuestaria, 14 00 001 005 000 construcción, ampliación, y reposición de escuelas integrales, para el proyecto construcción escuela de la reforma (EDR) santa cruz Muluá, Retalhuleu.


6. Ejecución presupuestaria

Ejecución proyectos de inversión nuevos

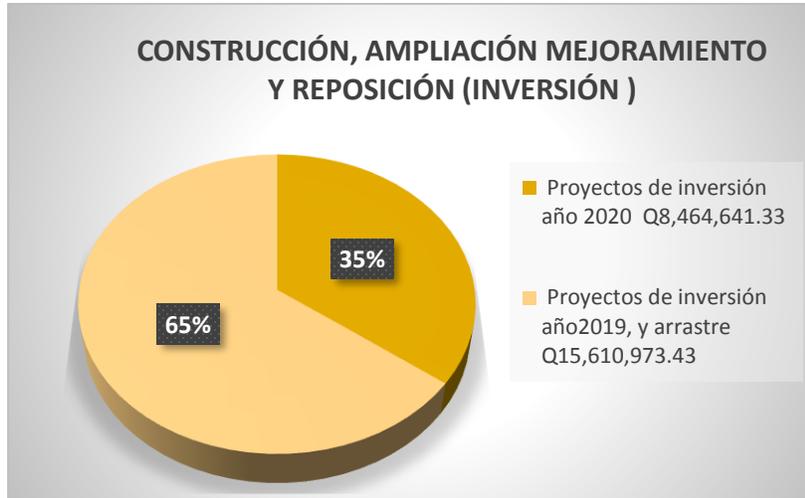

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN (INVERSIÓN)	
Proyectos de inversión año 2020	<u>Q.8,464,641.33</u>
Proyectos de inversión año 2019, y arrastre	<u>Q.15,610,973.43</u>
TOTAL	<u>Q.24,075,614.76</u>

Ejecución proyecto de Remozamientos integrales 2020

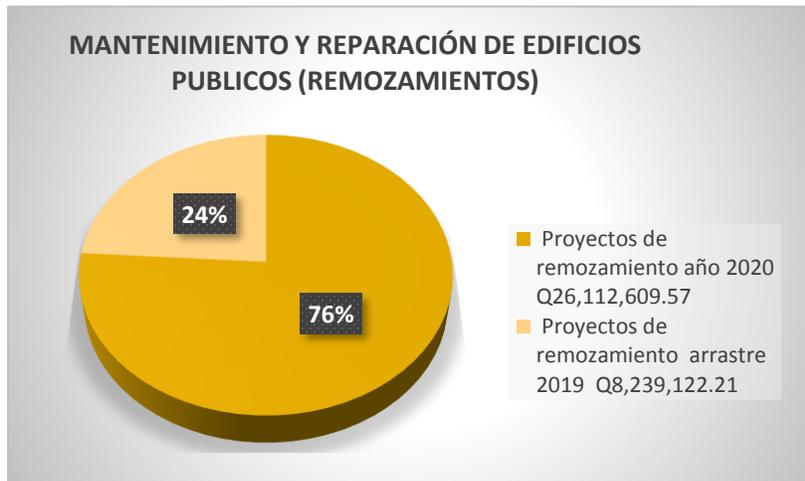

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS (REMOZAMIENTOS)	
Proyectos de remozamiento 2020	<u>Q 26,112,609.57</u>
Proyectos de remozamiento arrastre 2019	<u>Q 8,239,122.21</u>
TOTAL	<u>Q.34,351,731.78</u>

TOTAL, DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRAS DICIEMBRE 2020	
TOTAL, RENGLON 332	<u>Q 24,075,614.76</u>
TOTAL, RENGLON 171	Q 34,351,731.78
EJECUCIÓN AL 17/12/2020	Q 58,427,346.54

III. Principales desafíos

La dirección general, de la -(UCEE)- tiene como desafío, el incrementar de manera cuantitativa y cualitativa la intervención de todas las obras de infraestructura estatal y pública, cumpliendo con ejecutar lo programado de manera eficiente y eficaz, estando acorde con las necesidades actuales de la población de Guatemala, a corto, medio y largo plazo, todas estas acciones estarán dirigidas a través de Viceministerio de Edificios Estatales y Obras Públicas.

Así mismo con apoyo de todos los departamentos de la unidad se han propuesto nuevos retos para servir y beneficiar al pueblo de Guatemala; Se logró implementar el bien mueble: *adquisición e instalación de 594 módulos prefabricados de cocinas temporales “cocinas dignas”*, dentro del cual se tiene el reto de finalizar los 594 módulos, los cuales se encuentran ubicados en los 22 departamentos de Guatemala, durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021.

IV. ANEXOS



INFORME FOTOGRAFICO, PROYECTOS DE REMOZAMIENTOS
EJECUTADOS AÑO 2020



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, lunes 21 de mayo de 2020



DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, viernes 07 de agosto de 2020

No.1

Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de septiembre, Cabecera Municipal, San Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango.

AVANCE FÍSICO = 100 %
AVANCE FINANCIERO = 100 %
GRUPO 4

BENEFICIARIOS
 286 niños
 272 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 21 de mayo de 2020



DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 29 de octubre de 2020



No.2

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Cacalep, San Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango.



BENEFICIARIOS
93 niños
77 niñas

AVANCE FÍSICO = 100 %
AVANCE FINANCIERO = 100 %
GRUPO 4



ANTES , Fotografía, Supervisión -UCEE -, Jueves 21 de mayo de 2020



DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 29 de octubre de 2020



No.3

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tuicolpech, San Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango.




BENEFICIARIOS
65 niños
57 niñas

AVANCE FISCO = 100 %
AVANCE FINANCIERO = 100 %
GRUPO 3



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 21 de mayo de 2020

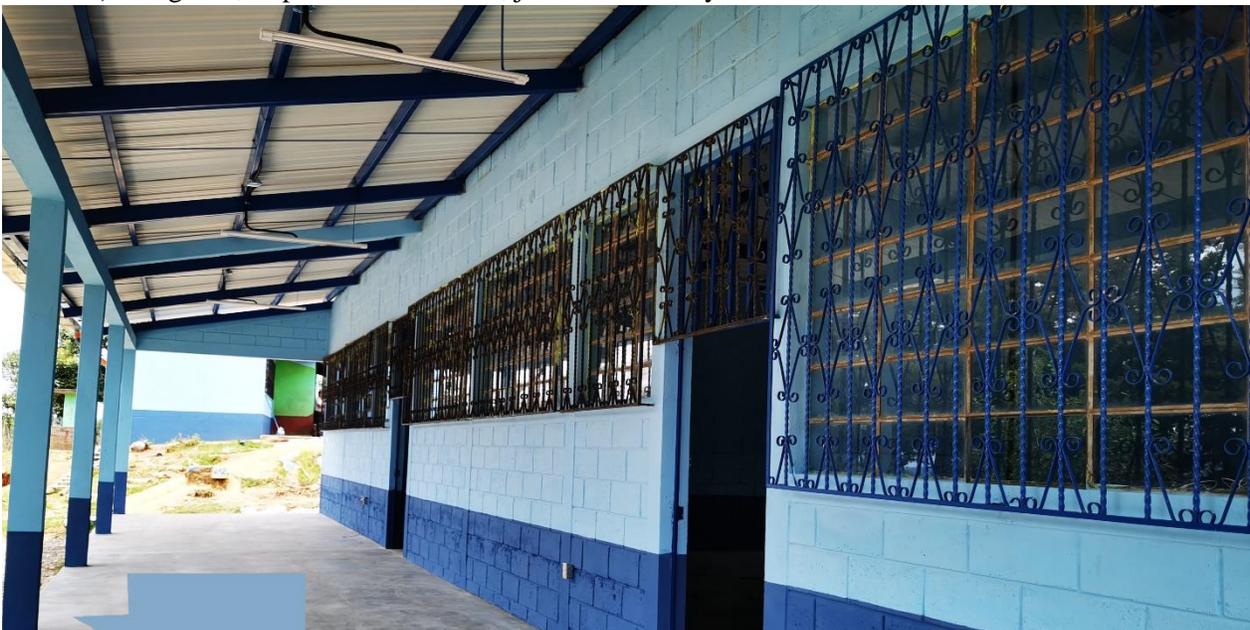

DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, jueves 29 de octubre de 2020



No.4

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tuitzin Aldea Piol, San Sebastián Huehuetenango,

AVANCE FÍSICO = 100 %

AVANCE FINANCIERO = 100 %

GRUPO 3

BENEFICIARIOS

58 niños

52 niñas





ANTES Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes 14 de Julio de 2020



DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, viernes, 16 de octubre de 2020

Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta cabecera municipal, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango

No.5

AVANCE FÍSICO = 100 %

AVANCE FINANCIERO = 89.90 %
GRUPO 5

BENEFICIARIOS

129 niños
126 niñas





ANTES Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 14 de julio de 2020



DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, viernes, 16 de octubre de 2020



No.6

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Caxepa Centro, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

AVANCE FÍSICO = 100 %

AVANCE FINANCIERO = 100%

GRUPO 6

BENEFICIARIOS

61 niños

93 niñas





ANTES Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 14 de julio de 2020



DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 14 de julio de 2020

No.7

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Crucero Caxepa, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.


AVANCE FÍSICO = 100 %

AVANCE FINANCIERO = 100 %
GRUPO 7

BENEFICIARIOS

27 niños

21 niñas

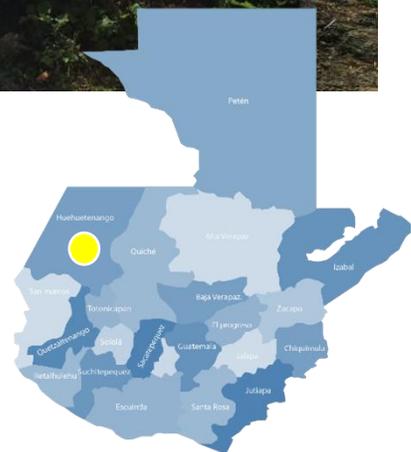



ANTES Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 14 de julio de 2020



DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE -, viernes, 16 de octubre de 2020

No.8

Escuela Oficial De Párvulos anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

AVANCE FÍSICO = 100 %

AVANCE FINANCIERO = 100 %
GRUPO 7

BENEFICIARIOS

61 niños
46 niñas





ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE -, martes, 21 de septiembre de 2020



DESPUÉS, Fotografías, Supervisión -UCEE -, martes, 17 de noviembre de 2020

No.9

Escuela Oficial Urbana Mixta no. 126 Andrés Bello 41 avenida y 12 calle "b" Jardines de la Asunción zona 5, Guatemala.

AVANCE FÍSICO = 61.45 %


AVANCE FINANCIERO = 59.91 %

GRUPO 9

BENEFICIARIOS


91 niños

65 niñas

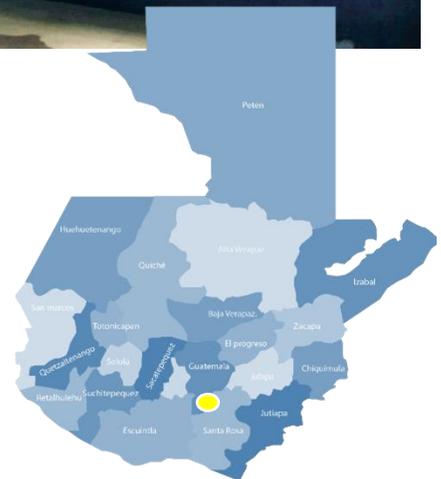



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 22 de septiembre de 2020

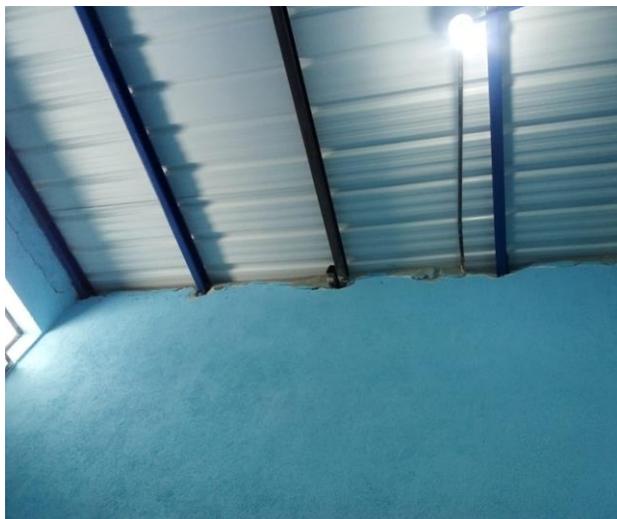

AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE -, viernes, 17 de noviembre de 2020.


No.10

Escuela Oficial De párvulos NO. 35 "Juan José Arévalo" 18 avenida 25-29 proyecto 4-3, zona 6 Guatemala

AVANCE FÍSICO = 60.85 %
AVANCE FINANCIERO = 55.96 %
GRUPO 9

BENEFICIARIOS

106 niños
 109 niñas

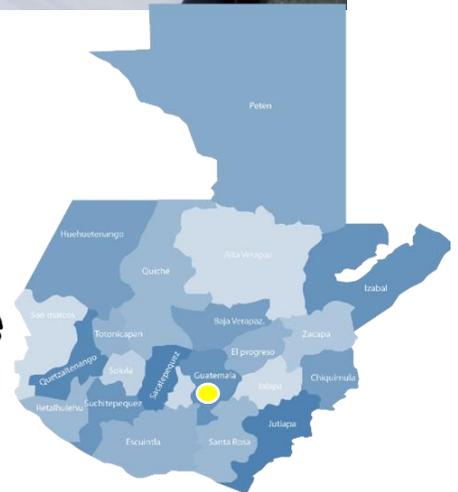



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 22 de septiembre de 2020



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE -, lunes 14 de diciembre de


No.11

Escuela Oficial Rural Mixta, No.800 Aldea Puerta del Señor, Fraijanes, Guatemala

AVANCE FÍSICO = 80.95 %
AVANCE FINANCIERO = 80.18 %
GRUPO 10

BENEFICIARIOS

265 niños
 240 niñas

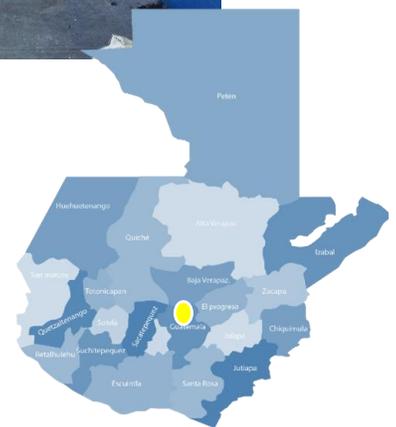



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, martes, 22 de septiembre de 2020



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE -, lunes 14 de diciembre de 2020


No.12

Escuela Oficial Rural Mixta, Parajes del Pueblo Viejo, Aldea Puertas del Señor, Fraijanes, Guatemala

AVANCE FÍSICO = 22.30 %
AVANCE FINANCIERO = 20.30 %
GRUPO 10

BENEFICIARIOS

264 niños
 259 niñas

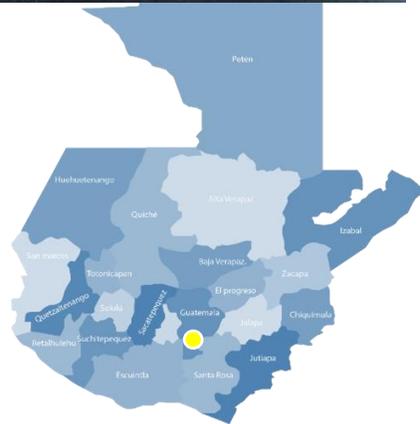



ANTES, Fotografía 1, Supervisión -UCEE -viernes, 30 de octubre de 2020

ANTES, Fotografía 2, Supervisión -UCEE -, miércoles, 18 de noviembre de 2020




AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE -, lunes 14 de diciembre de 2020

No.13

Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Canchón Km. 19 Carretera Al Salvador, Fraijanes, Guatemala


AVANCE FÍSICO = 88.96 %
AVANCE FINANCIERO = 88.88 %
GRUPO 10

BENEFICIARIOS
 36 niños
 31 niñas

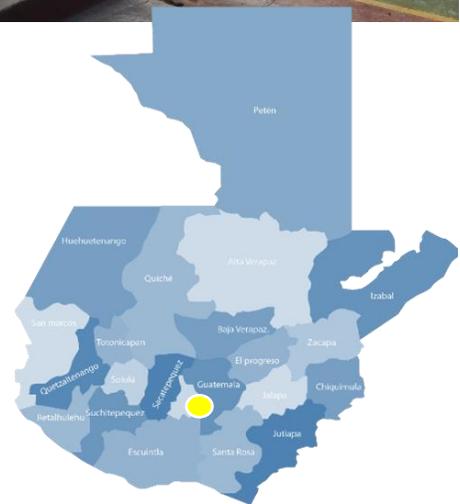



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE -, lunes 21 de septiembre de 2020

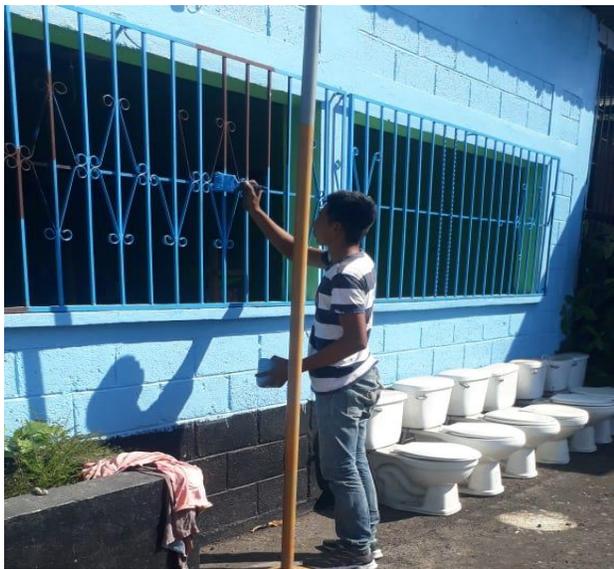

AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE-, martes 15 de diciembre de 2020

No.14

Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta, 6a. Ave. 0-82 zona 4, Colonia los Naranjales, Escuintla, Escuintla

AVANCE FÍSICO	= 82.85 %
AVANCE FINANCIERO	= 82.61 %
GRUPO 11	

BENEFICIARIOS
197 niños
153 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE-, martes 22 de septiembre de 2020



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE-, martes 17 de noviembre de 2020


No.15

Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Colonia Palmeras del Norte, Escuintla, Escuintla.

AVANCE FÍSICO = 69.15 %
AVANCE FINANCIERO = 68.85 %
GRUPO 11

BENEFICIARIOS

112 niños
 125 niñas

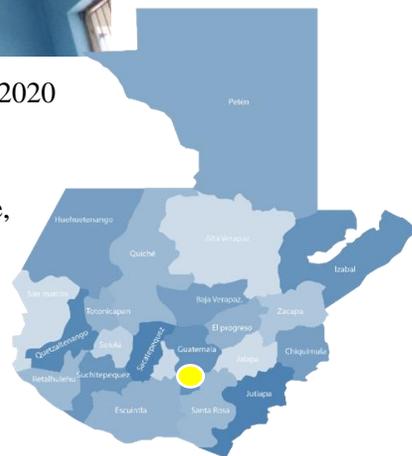



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE-, martes 04 de agosto de 2020.




DESPUÉS, Fotografías, Supervisión -UCEE-, lunes 23 de noviembre de 2020.

No.16

Escuela Oficial Urbana Mixta Prof. Eduardo Prado Ponce 1a. Calle 20-45,
Colonia las Brisas zona 6, Mixco Guatemala

AVANCE FÍSICO = 94.66 %
AVANCE FINANCIERO = 90.00 %
GRUPO 12

BENEFICIARIOS
98 niños
120 niñas

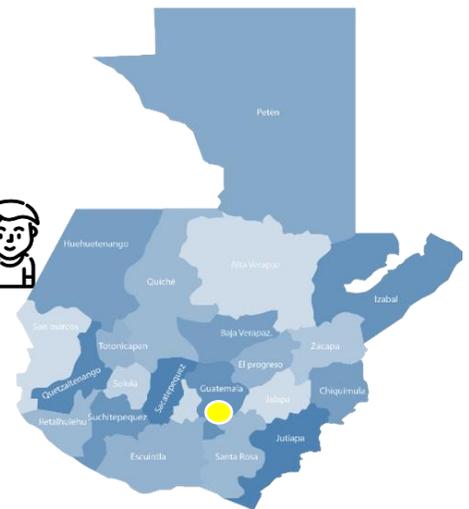



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE-, viernes 16 de octubre de 2020.




DESPUÉS, Fotografía, Supervisión -UCEE-, lunes 23 de noviembre de 2020.

No.17

Escuela Oficial Rural Mixta no. 794 Caserío el Sacabastal Aldea el Paraíso, Palencia, Guatemala

AVANCE FÍSICO = 98.43 %
AVANCE FINANCIERO = 85.06 %
GRUPO 13

BENEFICIARIOS
 25 niños
 23 niñas

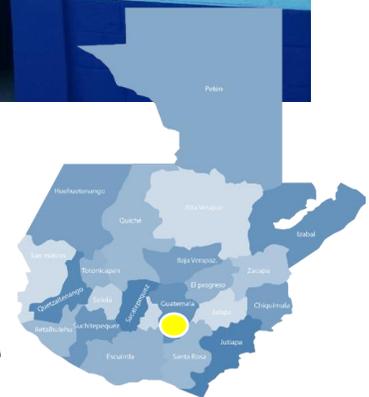



ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE-, viernes 16 de octubre de 2020.




No.18

DESPUÉS, Fotografías, Supervisión -UCEE-, lunes 23 de noviembre de 2020.

Escuela Oficial Rural Mixta “El Cerro de Corado” 4ª. Calle 5.77
Colonia Lomas del Capitán, Amatlán, Guatemala.

AVANCE FÍSICO = 90.24 %
AVANCE FINANCIERO = 81.31 %
GRUPO 14

BENEFICIARIOS
231 niños
198 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- viernes, 16 de octubre de 2020.



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.


Escuela Oficial Urbana Mixta / EODP "Profa. Sara Leticia Mazariegos León de Godoy" 1a. Calle final 1-04 colonia vista lago Amatitlán Guatemala

No.19

AVANCE FÍSICO = 93.70 %
AVANCE FINANCIERO = 58.71 %
GRUPO 14

BENEFICIARIOS

61 niños
 78 niñas

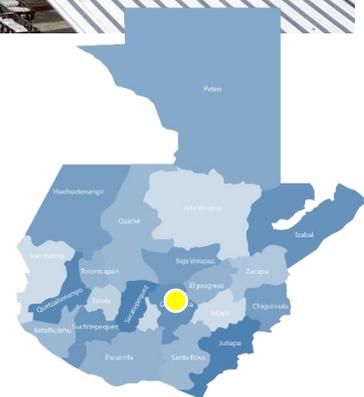



ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 29 de octubre de 2020



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 12 de noviembre de 2020.


No.20

Escuela Oficial Urbana Mixta "José agosto Reynosa Orellana" 8a. Avenida, lote 76, colonia San José, Barrio San Lorenzo Amatitlán, Guatemala

AVANCE FINANCIERO = 83.90%
AVANCE FÍSICO = 84.04%
GRUPO 15

BENEFICIARIOS

87 niños
 67 niñas

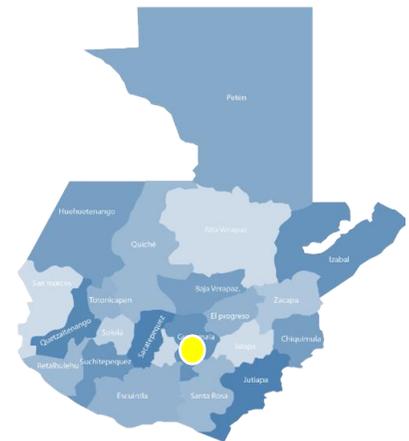



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- viernes, 16 de octubre de 2020




AVANCES, Fotografías, Supervisión -UCEE- viernes, 27 de noviembre de 2020

No.21

Escuela Oficial Urbana Mixta, Escuela Oficial Urbana Mixta El Progreso 2da. Av. Colonia el Progreso, Amatitlán, Guatemala.


AVANCE FINANCIERO = 73.11 %
AVANCE FÍSICO = 73.23 %
GRUPO 16

BENEFICIARIOS
 117 niños
 116 niñas

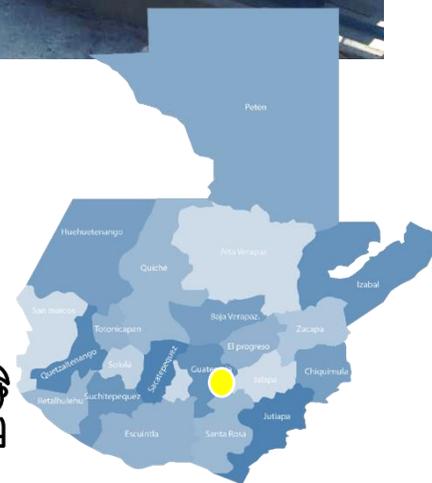



ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE- viernes, 16 de octubre de 2020

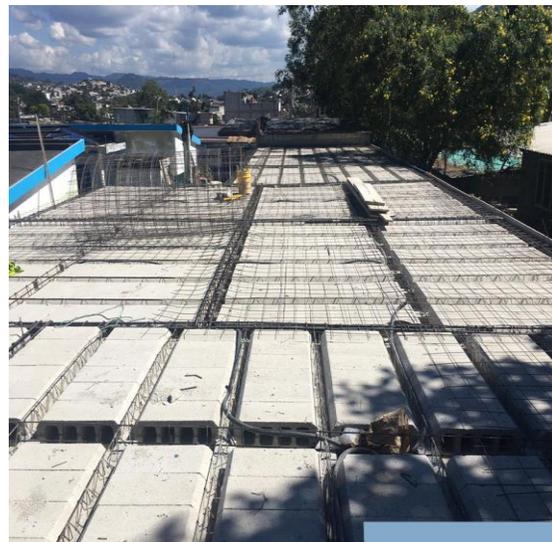

AVANCES, Fotografías, Supervisión -UCEE- viernes, 16 de octubre de 2020

No.22

Escuela Oficial Urbana Mixta, Escuela Oficial urbana mixta Rafael Iriarte
7 a. Ave. 7-35 Amatitlán, Guatemala.

AVANCE FINANCIERO = 78.08 %
AVANCE FÍSICO = 78.38 %
GRUPO 16

BENEFICIARIOS
326 niños
242 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- miércoles, 21 de octubre de 2020



AVANCES, Fotografías, Supervisión -UCEE-lunes, 30 de noviembre de 2020

No.23

Escuela Oficial Urbana Mixta no.114 Mateo Flores 4o Avenida a

AVANCE FINANCIERO = 83.35%

AVANCE FÍSICO = 90.00 %

GRUPO 17

BENEFICIARIOS

224 niños

246 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- miércoles, 21 de octubre de 2020



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.

No.24

Escuela Oficial De Parvulos 2a. Calle 2-58 zona 2 Zaragoza, Chimaltenango

AVANCE FINANCIERO = 0.00 %
AVANCE FÍSICO = 5.36 %
GRUPO 18

BENEFICIARIOS

90 niños

86 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 22 de octubre de 2020



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.

Escuela Oficial Urbana Mixta "EOUM Cantonal 1era. Avenida b 5-95 zona 3" Zaragoza Chimaltenango

No.25

AVANCE FINANCIERO = 0.00 %
AVANCE FÍSICO = 7.24 %
GRUPO 18

BENEFICIARIOS

86 niños
66 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 22 de octubre de 2020



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.


No.26

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Joya Grande, Zaragoza, Chimaltenango

AVANCE FINANCIERO =24.00 %
AVANCE FÍSICO =24.00 %
GRUPO 19

BENEFICIARIOS

166 niños
 150 niñas

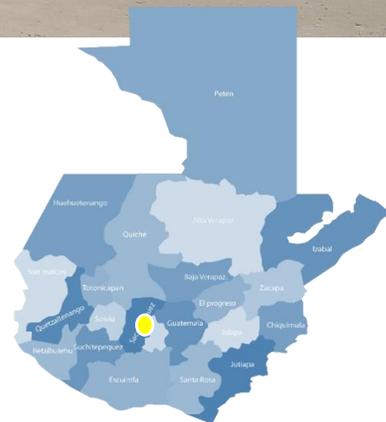



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 27 de octubre de 2020



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 19 de noviembre de 2020.

No.27


Escuela Oficial Urbana Mixta no.471 "Luz Isabel Sánchez" km. 14.5 col. Hno. Pedro, carretera al Atlántico zona 17, Guatemala

AVANCE FINANCIERO =61.00%
AVANCE FÍSICO =61.00 %
GRUPO 21

BENEFICIARIOS

194 niños

196 niñas

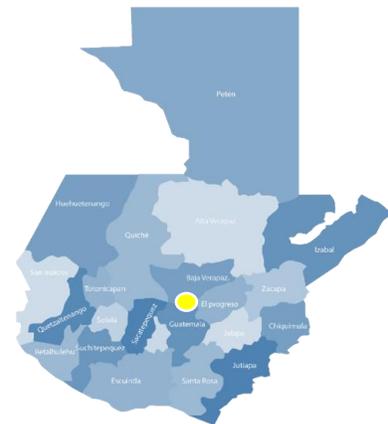



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 29 de octubre de 2020.



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 03 de diciembre de 2020.

No.28


Escuela Oficial Urbana Mixta colonia la Arenera, zona 21, Guatemala

AVANCE FINANCIERO = 00.00%
AVANCE FÍSICO = 39.00%
GRUPO 21

BENEFICIARIOS

133 niños

122 niñas

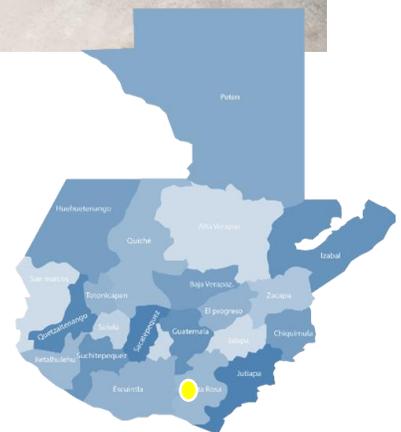



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- jueves, 23 de abril de 2020.



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 17 de diciembre de 2020.

Escuela Oficial De Parvulos, Integral Belice, cuarto Cantón San Pedro

No.29 Chimaltenango

AVANCE FINANCIERO =34.00 %
AVANCE FÍSICO =50.00 %
GRUPO 24

BENEFICIARIOS
 125 niños
 117 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 19 de octubre de 2020.



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- miércoles, 09 de diciembre de 2020.

No.30

Escuela Oficial Rural Mixta sector Chiacte Chipoc, Santa María Cahabon, Alta Verapaz

AVANCE FINANCIERO =00.00 %


AVANCE FÍSICO =30.00 %

GRUPO 26

BENEFICIARIOS

30 niños

31 niñas

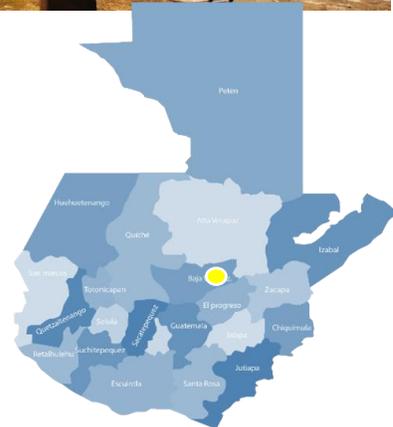



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 19 de octubre de 2020.



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 10 de diciembre de 2020

No.31

Escuela Oficial Rural Mixta, comunidad Santa María La Pila, Santa María Cahabon, Alta Verapaz

AVANCE FINANCIERO = 00.00 %


AVANCE FÍSICO = 34.04 %

GRUPO 28

BENEFICIARIOS

20 niños

14 niñas

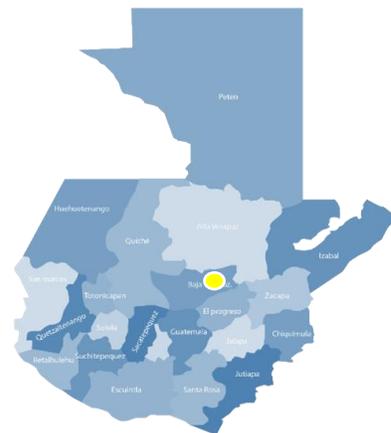



ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 16 de septiembre de 2020




AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 03 de diciembre de 2020.

Remozamiento Escuela Oficial Urbana de niñas tipo Federación “dr. Ulises Rojas Benfell” San Marcos, San Marcos

No.32

AVANCE FINANCIERO = 59.40 %
AVANCE FÍSICO = 59.40 %
GRUPO N/A

BENEFICIARIOS
 301 niñas

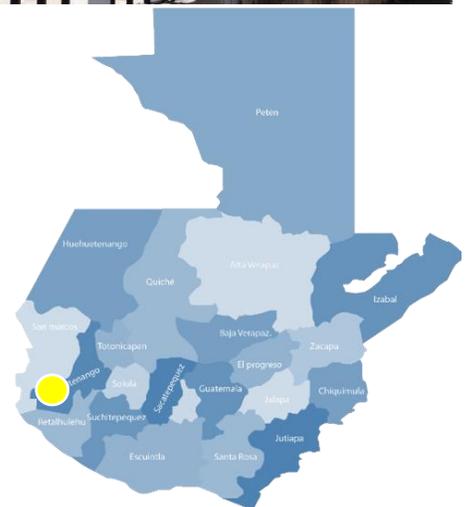



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 29 de octubre de 2020.




AVANCE, Fotografía, supervisión -UCEE- viernes, 17 de diciembre de 2020

No.33

Remozamiento Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta no. 146 Lic. Eduardo Cáceres Lehnhoff, 17 avenida 6-95, zona 14 ciudad capital

AVANCE FINANCIERO = 50.00 %
AVANCE FÍSICO = 57.00 %
GRUPO 8

BENEFICIARIOS
 166 niños
 143 niñas

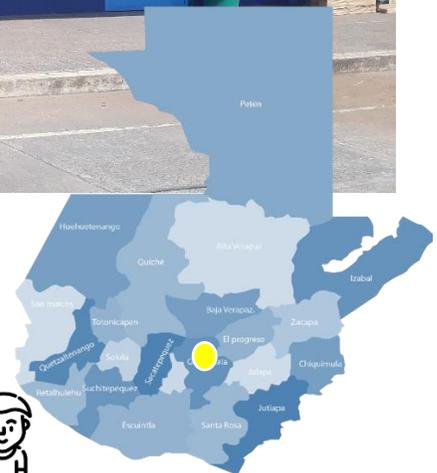



AVANCE Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 29 de octubre de 2020.



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 17 de diciembre de 2020.

Remozamiento Escuela Primaria Oficial Urbana de Varones no. 20 Republica del Ecuador, 23 calle a 35-56, zona 5, ciudad capital.

AVANCE FINANCIERO = 50.00 %
AVANCE FÍSICO = 57.00 %
GRUPO 8

No.34

BENEFICIARIOS
 312 niños





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 16 de septiembre de 2020.



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.

No.35

Remozamiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Los Pajales I, Acatenango, Chimaltenango.

AVANCE FINANCIERO = 6.82 %


AVANCE FÍSICO = 8.16 %

GRUPO 20

BENEFICIARIOS

40 niños

39 niñas

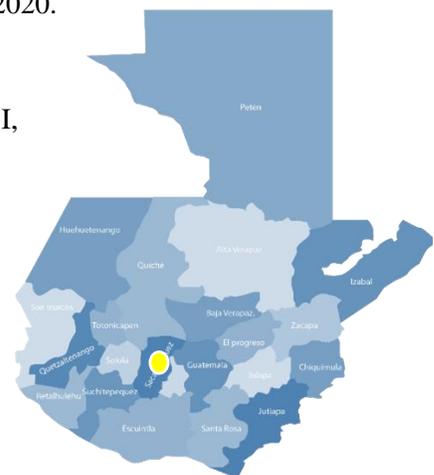



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 10 de diciembre de 2020.

No.36

Remozamiento Escuela Oficial Rural Mixta, caserío San José Canihor, santa María Cahabón, Alta Verapaz.

AVANCE FINANCIERO = 0.00 %
AVANCE FÍSICO = 34.00 %
GRUPO 28

BENEFICIARIOS
 25 niños
 21 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 16 de septiembre de 2020.



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- miércoles, 04 de noviembre de 2020.

No.37

Remozamiento Escuela Oficial Rural Mixta, no. 1530 Aldea Sacoj Grande, Mixco, Guatemala

AVANCE FINANCIERO = 41.00 %
AVANCE FÍSICO = 41.00 %
GRUPO 22

BENEFICIARIOS

222 niños
 224 niñas





ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- miércoles, 28 de octubre de 2020.




AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- viernes, 04 de diciembre de 2020.

Remozamiento Escuela Oficial Rural Mixta, no. 915 Caserío Las Lomas Colonia Tres Sabanas, Chinautla, Guatemala

No.38

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 12.35 %
GRUPO 30

BENEFICIARIOS
 69 niños
 43 niñas






AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.

Remozamiento Escuela Oficial de Párvulos y Preprimaria Bilingüe, mazana "o" lote 1, colonia Tierra Nueva 1, Chinautla, Guatemala.

No.39

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 14.20 %
GRUPO 30

BENEFICIARIOS
 97 niños
 83 niñas

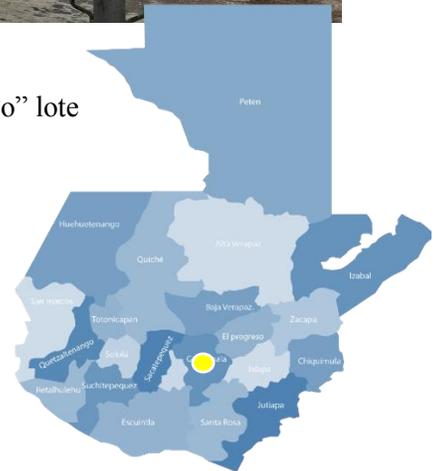



ANTES, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.




AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.

Remozamiento EPDP sector 8, 24 avenida 15-87 zona 7 colonia Villa Hermosa I, San Miguel Petapa, Guatemala.

No.40

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 7.23 %
GRUPO 31

BENEFICIARIOS
 171 niños
 193 niñas





AVANCE, Fotografía, Supervisión -UC EE- lunes, 14 de diciembre de 2020.


Remozamiento EORM parcelamiento San Rafael Augusto Mejía
Medina, Aldea el Jocotillo, Villa Canales, Guatemala

No.41

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 10.22 %
GRUPO 31

BENEFICIARIOS

366 niños
335 niñas






AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.


Remozamiento Instituto Nacional Experimental de Educación Básica con reorientación ocupacional profesor Héctor nere Castañeda Calderón

No.42

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 6.55 %
GRUPO 32

BENEFICIARIOS
 292 niños
 319 niñas

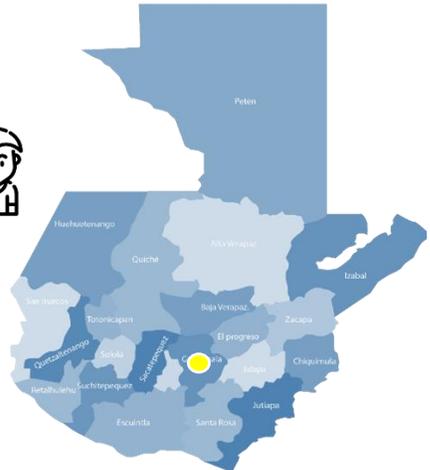

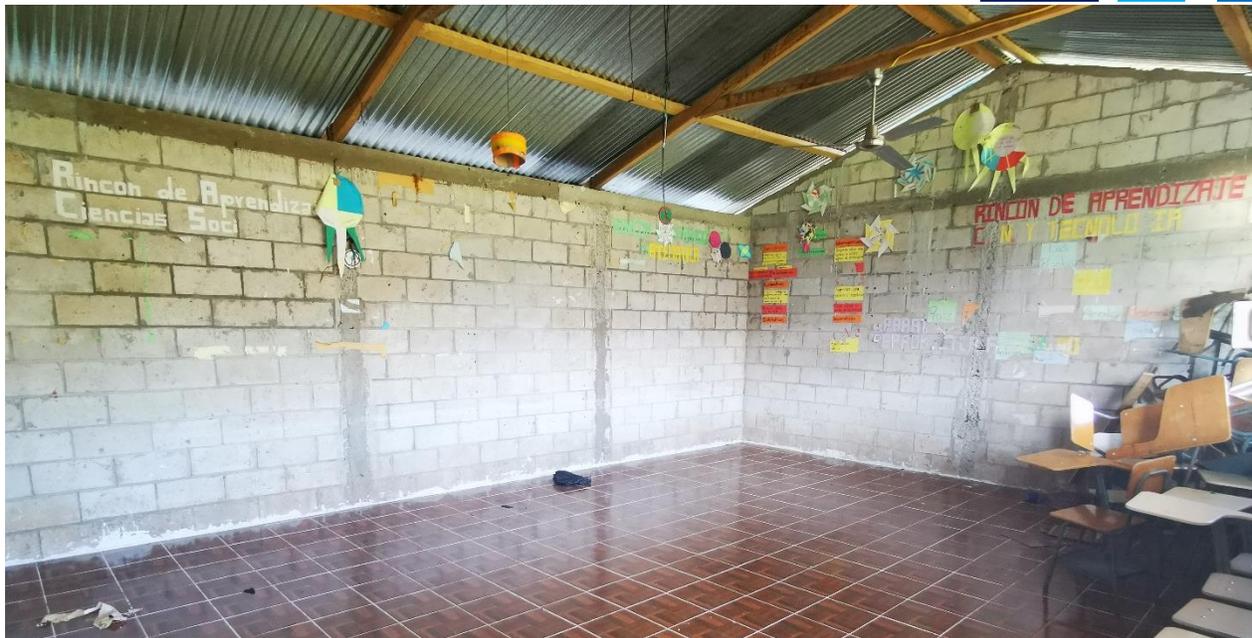


ESTADO ACTUAL, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.

Remozamiento EORM Comunidad Tierra Blanca Sebol, Cobán, Alta Verapaz

No.43

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 1.25 %
GRUPO 35

BENEFICIARIOS
49 niños
53 niñas

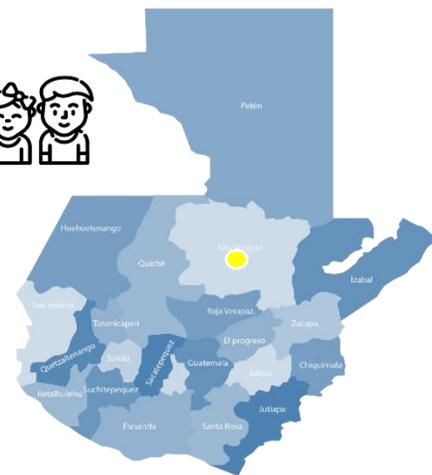



ESTADO ACTUAL, Fotografías, Supervisión -UCEE- jueves, 10 de diciembre de 2020.

No.44

Remozamiento EORM, caserío San Francisco Canihor, Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 1.25 %
GRUPO 25

BENEFICIARIOS

11 niños
16 niñas





AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre de 2020.

No.45

Remozamiento EORM, Tecún Umán, 10 avenida 4-81 zona 3, aldea Nuevo Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala.

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 12.45 %
GRUPO 37

BENEFICIARIOS

399 niños
 340 niñas





AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.

No.46

Remozamiento EOUM, no. 41 sección w, colonia El Milagro, zona 6, Mixco

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 9.78 %
GRUPO 36

BENEFICIARIOS

136 niños
 141 niñas





AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020.

No.47

Remozamiento INEB Miguel García Granados, ave. Moctezuma 31-02, colonia Bethania, zona 7

AVANCE FINANCIERO = 0 %
AVANCE FÍSICO = 9.78 %
GRUPO 36

BENEFICIARIOS

337 niños

320 niñas





ANTES, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 05 de mayo de 2020.



AVANCES, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre de 2020.


No.48

Remozamiento Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Tuzbilpec, Santa María Cahabon, Alta Verapaz.

AVANCE FINANCIERO = 0.00 %
AVANCE FÍSICO = 4.08 %
GRUPO 27

BENEFICIARIOS

15 niños
19 niñas

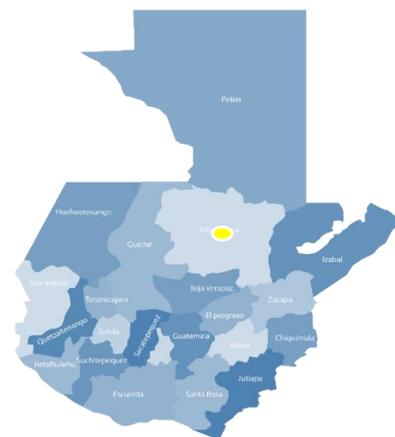

INFORME FOTOGRAFICO DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE INVERSIÓN



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre de 2020.


Construcción Instituto Diversificado e Instituto Básico, cabecera municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos

AVANCE FINANCIERO = 23.74 %

AVANCE FÍSICO = 33.61 %
SNIP 170188

BENEFICIARIOS

16 niños
21 niñas

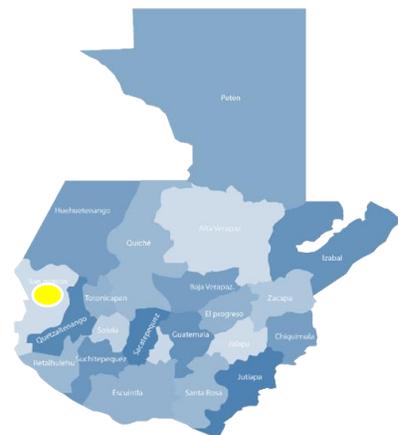



AVANCE, Fotografías, Supervisión -UCEE- viernes, 18 de diciembre de 2020.

Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Jovi, Cuilco, Huehuetenango


AVANCE FINANCIERO = 61.02 %

AVANCE FÍSICO = 68.77 %
SNIP 133369

BENEFICIARIOS

30 niños

28 niñas

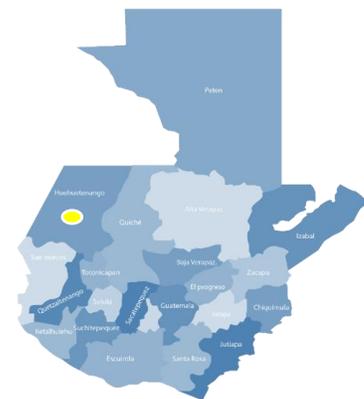



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UC EE- lunes, 14 de diciembre de 2020

Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, caserío San Antonio, Aldea, Paviltzaj, Cuilco, Huehuetenango.


AVANCE FINANCIERO = 48.60 %

AVANCE FÍSICO = 76.13 %
SNIP 170181

BENEFICIARIOS

19 niños

11 niñas

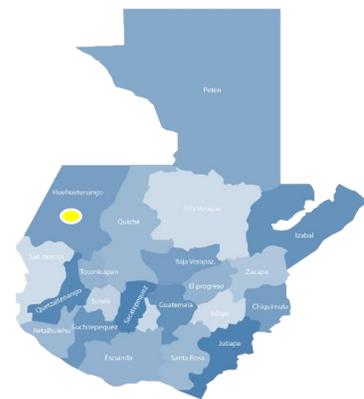



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- lunes, 14 de diciembre de 2020


Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, aldea Huispache, Concepción Tutuapa, San Marcos.

AVANCE FINANCIERO = 20.28 %
AVANCE FÍSICO = 31.76 %
SNIP 224685

BENEFICIARIOS

188 niños

181 niñas

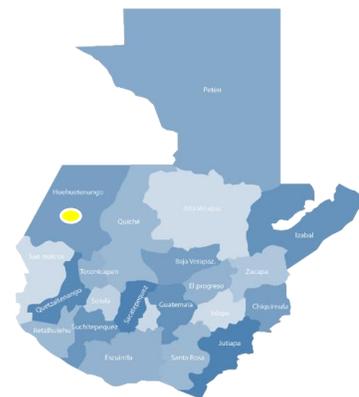



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre de 2020


Construcción Edificio de la Delegación departamental de Petén en el Municipio de Flores departamento de Peten

AVANCE FINANCIERO = 25.70 %
AVANCE FÍSICO = 27.00%
SNIP 256611

BENEFICIARIOS

186 hombres

181 mujeres

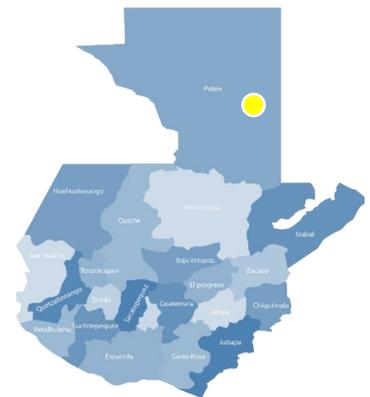



AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre de 2020

Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, aldea la Vega, Zacualpa, Quiché.

AVANCE FINANCIERO = 34.44 %
AVANCE FÍSICO = 34.52 %
SNIP 132781

BENEFICIARIOS
 73 hombres
 61 mujeres





AVANCE, Fotografía, Supervisión -UCEE- martes, 15 de diciembre de 2020

Construcción de la delegación Subdepartamental de Ixcán, Quiché

AVANCE FINANCIERO = 26.25%
AVANCE FÍSICO = 28.75%
SNIP 254887

BENEFICIARIOS

31 hombres

46 mujeres

